

小中川児童クラブの整備方針の変更について

小中川児童クラブについては、現在、第一児童クラブを「福祉の家」の2階、第二児童クラブを「小中川児童館」の2階で開設しています。このうち、第一児童クラブについては、「福祉の家」解体に伴い、小中川児童館の隣地に建設・移転する方針でした。しかし、児童の安全・保護者の安心（夏季の熱中症対策、冬季の風雪対策、交通事故防止、防犯対策等）を最優先に改めて検討した結果、小中川小学校敷地内のプール跡地に、第一児童クラブと第二児童クラブを併せた新たな児童クラブを建設・移転する方針に変更したいと考えています。

加えて、今回の方針変更に伴う事業費の増加について、補正予算の上程をお願いするものです。


1. 小学校周辺施設の方針変更一覧 ※1：一つの建物に3つの児童クラブ室を設置することで、適切な規模及び環境が整備され、有利な交付金が見込まれる。

施設	変更前	変更後
小中川児童クラブ	小中川児童館隣地に第一児童クラブを建設、小中川児童館2階の第二児童クラブと共に運用	小中川小学校プール跡地に第一～第三児童クラブ※1として建設
小中川小学校（プール跡地）	駐車場	新児童クラブ+駐車場（グラウンドの一部含む）
小中川児童館	1階は児童館、2階は児童クラブ	今後のあり方を検討
小中川公民館	既存のまま	

2. 小学校周辺施設の位置図



3. 小学校内の事業計画図

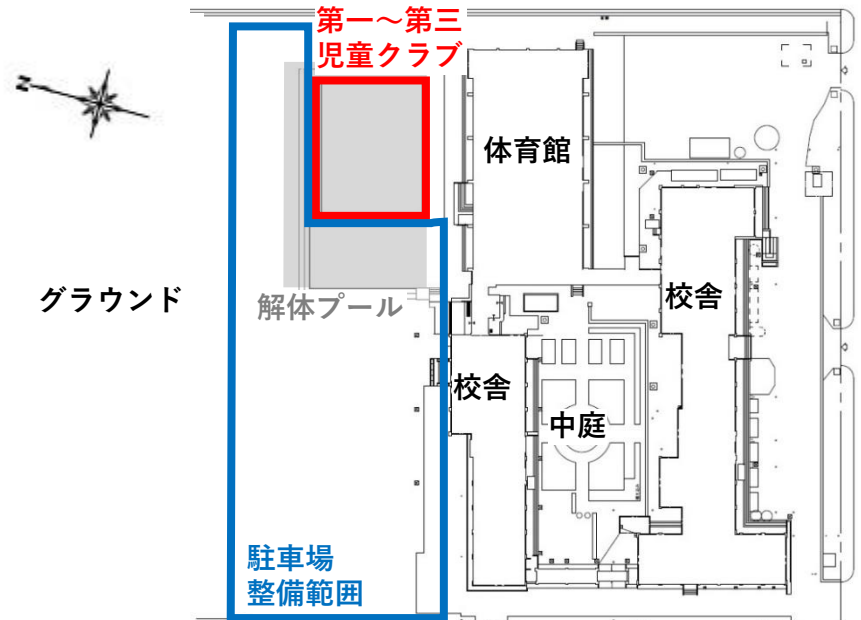

4.児童クラブ建設の事業費（概算）の比較

方針変更により事業費は大きく増額しますが、有利な交付金を活用することで市費負担の増額を最小限に抑えられます。

(千円)

変更前			変更後			差額
第一児童 クラブ 建設事業費	設計業務委託費	5,400	第一～第三 児童クラブ 建設事業費 (規模拡大)	設計業務委託費	9,300	3,900
	確認手数料等	196		確認手数料等	659	463
	監理業務委託費 (R6予算)	3,800		監理業務委託費 (R6予算)	6,500	2,700
	概算工事費 (R6予算)	112,013		概算工事費 (R6予算)	253,237	141,224
	計 (①)	121,409		計 (③)	269,696	148,287
児童クラブ建設に係る交付金※ ² (②)		19,373	児童クラブ建設に係る交付金※ ³ (④)		159,828	140,455
児童クラブ建設に係る市費負担分 (①－②)		102,036	児童クラブ建設に係る市費負担分 (③－④)		109,868	7,832

※²：学校敷地外に第一児童クラブ室を整備する場合

※³：学校敷地内に第一～第三児童クラブ室を整備する場合

(参考)

児童クラブ運営に係る毎年の補助金についても、前述の建設に係る交付金と同様に、第一から第三の適切な規模の児童クラブ室を整備することで、補助額が有利になります。

(千円)

変更前		変更後		差額
児童クラブ運営に係る補助金 (一部概算) ※ ⁴	3,889	児童クラブ運営に係る補助金 (一部概算) ※ ⁵	9,352	5,463

※⁴：学校敷地外で第一～第二児童クラブを運営する場合
71人以上支援の単位 2,917千円×2支援×2/3

※⁵：学校敷地内で第一～第三児童クラブを運営する場合
36～45人支援の単位 4,676千円×3支援×2/3

5.補正予算額

このたびの整備方針の変更により、児童クラブの建物規模の拡大による設計業務委託料等の増額に加えて、令和7年度に計画していた小中川小学校プール解体工事の前倒し実施に関連して生じる経費について、補正予算をお願いいたします。

なお、本補正予算において事業名を「小中川第一児童クラブ建設事業」から「小中川児童クラブ建設事業」に変更させていただきます。

(千円)

事業名	細々節名	当初予算	補正予算額	補正後
小中川児童クラブ建設事業	設計業務委託料	5,400	3,900	9,300
	確認手数料等	196	463	659
	計 (a)	5,596	4,363	9,959
小中川小学校プール解体・駐車場等整備事業	設計業務委託料	0	2,500	2,500
	工事請負費	0	126,000	126,000
	監理業務委託料	0	1,900	1,900
	計 (b)	0	130,400	130,400
合計 (a+b)		5,596	134,763	140,359

6.今後のスケジュール (予定)

	令和5年度									令和6年度									令和7年度							
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
児童クラブ建設	★ 議会説明	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	★ 契約議決	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
		児童クラブ設計入札	児童クラブ設計期間						児童クラブ設計内容の精査	児童クラブ建設入札		児童クラブ建設工事												開設準備(引越など)	共用開始	
プール解体		←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←				
		プール解体設計入札	プール解体設計期間(外構整備設計含む)					プール解体設計内容の精査	プール解体工事入札	プール解体工事																
